Backlog Sprint 1

FAAN-S0 9 janv. – 23 janv. (53 tickets) | 0 | 45 | 33 | Terminer le sprint

~~FAAN-34~~	Créer un stock	GESTION DES STOCKS	TERMINÉ(E)	2	
~~FAAN-83~~	Créer un client	GESTION DES CLIENTS	TERMINÉ(E)	2	
~~FAAN-6~~	Se connecter	AUTHENTIFICATION	TERMINÉ(E)	5	
~~FAAN-68~~	Accéder aux routes en fonction de son rôle	AUTHENTIFICATION	TERMINÉ(E)	3	
~~FAAN-222~~	Créer les utilisateurs initiaux	AUTHENTIFICATION	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-157~~	Créer un rôle	GESTION DES RÔLES	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-37~~	Visualiser des articles	GESTION DES OBJET...	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-35~~	Modifier un stock	GESTION DES STOCKS	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-36~~	Visualiser des stocks	GESTION DES STOCKS	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-39~~	Créer un Fournisseur	GESTION DES FOURN...	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-40~~	Modifier un Fournisseur	GESTION DES FOURN...	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-41~~	Visualiser des Fournisseurs	GESTION DES FOURN...	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-45~~	Visualiser des mises à jour	GESTION DES MISES ...	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-46~~	Modifier une mise à jour	GESTION DES MISES ...	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-74~~	Visualiser une commande	GESTION DES COMM...	TERMINÉ(E)	1	AS
~~FAAN-88~~	Visualiser un conditionnement de commande	GESTION DES CONDI...	TERMINÉ(E)	1	AS
~~FAAN-47~~	Mettre en place la base de données		TERMINÉ(E)	2	
~~FAAN-87~~	Lister les clients	GESTION DES CLIENTS	TERMINÉ(E)	1	MF
~~FAAN-152~~	Créer un Utilisateur	GESTION DES UTILIS...	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-158~~	Modifier un rôle	GESTION DES RÔLES	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-159~~	Visualiser des rôles	GESTION DES RÔLES	TERMINÉ(E)	1	
~~FAAN-160~~	Supprimer des rôles	GESTION DES RÔLES	TERMINÉ(E)	3	
FAAN-49	Modifier un conditionnement relatif	GESTION DES CONDI...	À MATURER	2	AP
FAAN-51	Supprimer un conditionnement relatif	GESTION DES CONDI...	À MATURER	2	AP
FAAN-86	Modifier un conditionnement de commande	GESTION DES CONDI...	À MATURER	3	AS
FAAN-89	Supprimer un conditionnement de commande	GESTION DES CONDI...	À MATURER	3	AS
FAAN-18	Supprimer un article	GESTION DES OBJET...	À TESTER	1	AP
FAAN-54	Créer une ligne de stock	GESTION DES STOCKS	À TESTER	1	AP
FAAN-53	Visualiser des lignes de stock	GESTION DES STOCKS	À TESTER	1	AP
FAAN-42	Supprimer un Fournisseur	GESTION DES FOURN...	À TESTER	1	AP
FAAN-255	Modifier une adresse	GESTION DES ADRES...	À TESTER	1	MF
FAAN-254	Ajouter une adresse	GESTION DES ADRES...	À TESTER	1	MF
FAAN-256	Supprimer une adresse	GESTION DES ADRES...	À TESTER	2	MF
FAAN-289	Créer une commune	GESTION COMMUNE	À TESTER	1	MF
FAAN-290	Modifier une commune	GESTION COMMUNE	À TESTER	1	MF

Backlog Sprint 1

FAAN-291	Supprimer une commune		GESTION COMMUNE	À TESTER	1	MF
FAAN-48	Créer un conditionnement relatif		GESTION DES CONDI...	À TESTER	2	AP
FAAN-50	Visualiser des conditionnements relatifs		GESTION DES CONDI...	À TESTER	1	AP
FAAN-72	Créer une commande		GESTION DES COMM...	À TESTER	2	AS
FAAN-73	Modifier une commande		GESTION DES COMM...	À TESTER	2	AS
FAAN-75	Supprimer une commande		GESTION DES COMM...	À TESTER	2	AS
FAAN-82	Créer un conditionnement de commande		GESTION DES CONDI...	À TESTER	1	AS
FAAN-77	Créer un détail commande		GESTION DES DÉTAIL...	À TESTER	1	AS
FAAN-78	Modifier un détail commande		GESTION DES DÉTAIL...	À TESTER	1	AS
FAAN-79	Visualiser un détail commande		GESTION DES DÉTAIL...	À TESTER	1	AS
FAAN-80	Supprimer un détail commande		GESTION DES DÉTAIL...	À TESTER	1	AS
FAAN-85	Supprimer un client		GESTION DES CLIENTS	À TESTER	2	MF
FAAN-52	Modifier une ligne de stock		GESTION DES STOCKS	BLOQUÉ	1	AP
FAAN-44	Créer une mise à jour		GESTION DES MISES ...	BLOQUÉ	1	AP
FAAN-17	Modifier un article		GESTION DES OBJET...	BLOQUÉ	2	AP
FAAN-16	Créer un article		GESTION DES OBJET...	BLOQUÉ	2	AP
FAAN-84	Modifier un client		GESTION DES CLIENTS	BLOQUÉ	1	MF
FAAN-154	Visualiser les utilisateurs		GESTION DES UTILIS...	EN COURS	1	AP

53 tickets / 78 story points

DoR & DoD

Definition of Ready

- Suffisamment découpé pour rentrer dans le sprint
- Formalisé clairement sous la forme « En tant que ... »
- Démontrable
- Critères d'acceptation définis avec Gherkin
- Règles métier explicitées
- Périmètre clair
- Jeu de données fourni si besoin
- Challengé en cérémonie tripartite PO / Testeur / Développeur
- Contexte compris par la personne assignée
- Routes et messages d'erreur définis

Definition of Done

- Critères d'acceptation valides
- Validation par QA (tests SquashTM passants)
- Tests passants sur CI (TU, intégration, qualité de code)
- Code revu par un développeur ou un agent IA (issues bloquantes résolues)
- Pas d'erreurs de compilation
- Documentation rédigée

Burndown Chart

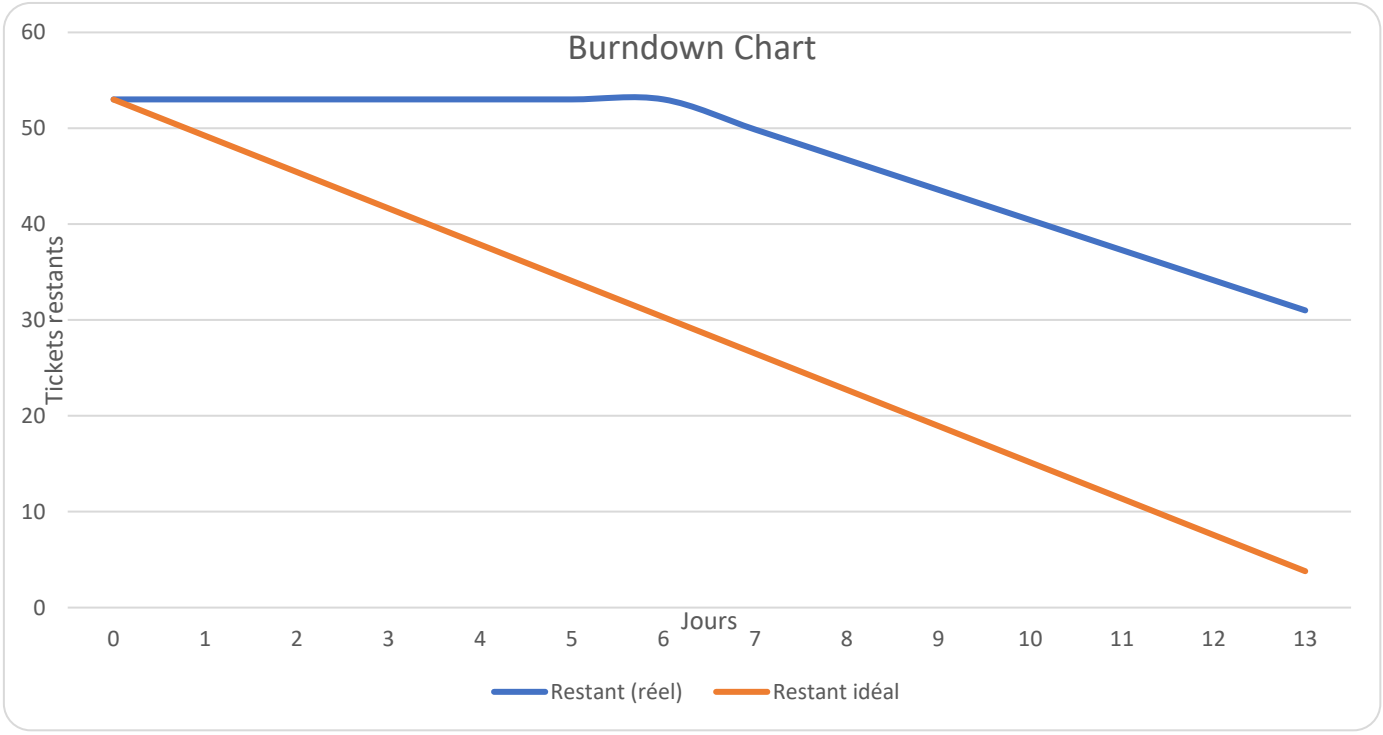

- **Terminé :** 22 (33 Story Points)
- **A tester :** 21 (27 Story Points)
- **Reliquat :** 1 (1 Story Point)
- **Bloqué :** 5 (7 Story Points)
- **A maturer :** 4 (10 Story Points)

Vélocité : 3,3 SP/J

Arbitrages

7. Décisions / Actions

- US en attente de tests QA :
  - Priorité sur les US avec **QA incomplète**
  - US de suppression doivent être **testées en dernier** (valeur utilisateur inférieure)
- Blocages identifiés
  - **FAAN-52** (Modifier une ligne de stock)**:** Echec QA non identifié ⇒ Vérifier la campagne SquashTM
  - **FAAN-44** (Créer une mise à jour)**:**
    - Création du bug **FAAN-283 : Mise à jour peut être créée avec date future**
    - Création du bug **FAAN-287 : Message d'erreur à modifier pour création avec article inexistant**
  - **FAAN-17**(Modifier un article)**:** Création du bug **FAAN-200** : **Code 200 lors de MAJ avec données incohérentes**
  - **FAAN-18**(Créer un article): Création du bug **FAAN-285** : **Message d'erreur à modifier pour création d'article**
  - **FAAN-84**(Modifier un client): Création du bug **FAAN-292**: **Email non conforme**
- US à maturer :
  - Le développement de ces US ne peut être mené à son terme en l'état. Les **règles métier sont trop peu explicites** (Ex: Que faire en cas de modification d'un conditionnement ou d'un conditionnement relatif ? Faut-il recalculer les autres conditionnements relatifs ?)
  - En conséquence, ces US vont être **replacées dans le Backlog** afin d'être re-challengées par l'équipe
  - Ces US ne seront pas acceptées dans le Sprint Backlog **tant qu'elles ne respecteront pas la *Definition of Ready***
- Finaliser **FAAN-154 :** Visualiser les utilisateurs

8. Backlog & prochain sprint

- Validation QA des 21 US à tester
- Priorité sur la correction des bugs identifiés pour FAAN-52, FAAN-44, FAAN-17, FAAN-52, et FAAN-52,
- Consolidation des modules commandes / conditionnements / communes / adresses

9. Conclusion

Le sprint couvre une bonne part des fonctionnalités attendues avec **20 US terminées**. Cependant, trop d'US ne sont pas qualifiées et la priorité sera accordée à la qualification de ces US au cours du prochain sprint. Quelques bugs ont été recensés et ceux affectant les US liées au articles devront être résolus en priorité. Les actions proposées doivent permettre de sécuriser la qualité et finaliser les livraisons au prochain sprint.
